Социальный проект «Спортивная площадка для сельских детей»

Авторы проекта:

Глазкова Н.А., Кашина Т.В.-

члены Управляющего совета

МОУ «Нач.школа-дет.сад № 24 Солнышко»

Консультанты проекта:

Жеварина Н.А.

директор МОУ «Нач.школа - дет.сад № 24 «Солнышко»,

С.Н. Гагарина- заведующая

Дом культуры п. Микляиха

http://aida.ucoz.ru

МОУ « Начальная школа- детский сад № 24 « Солнышко»

Дом культуры

Спортзал на фабрике

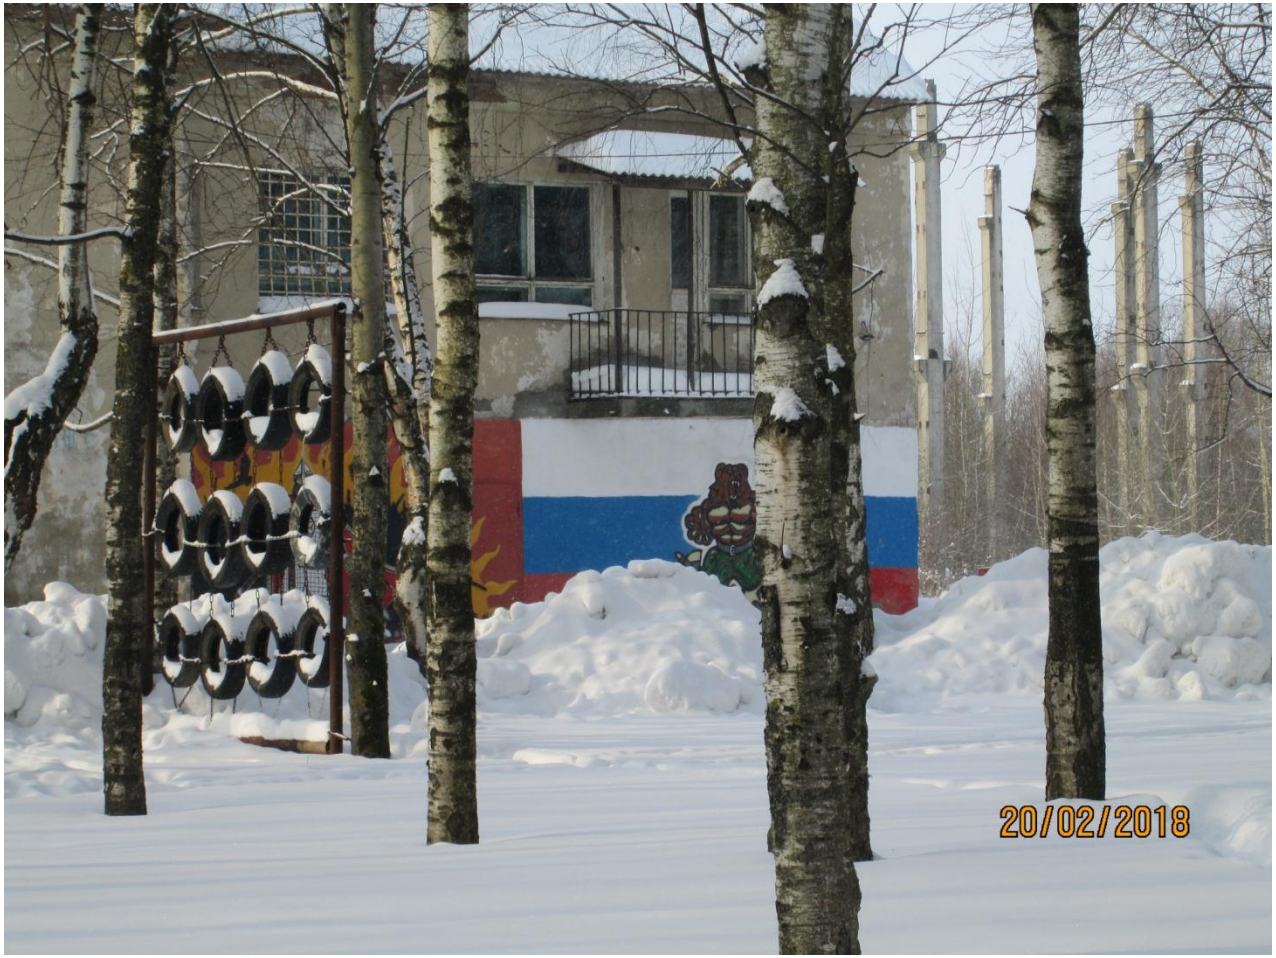

парк

парк

Уже реализованная инициатива

Участники проекта:

- УС МОУ «Начальная школа –детский сад № 24» Солнышко
- ДК п. Микляиха.
- активные граждане поселка Микляиха

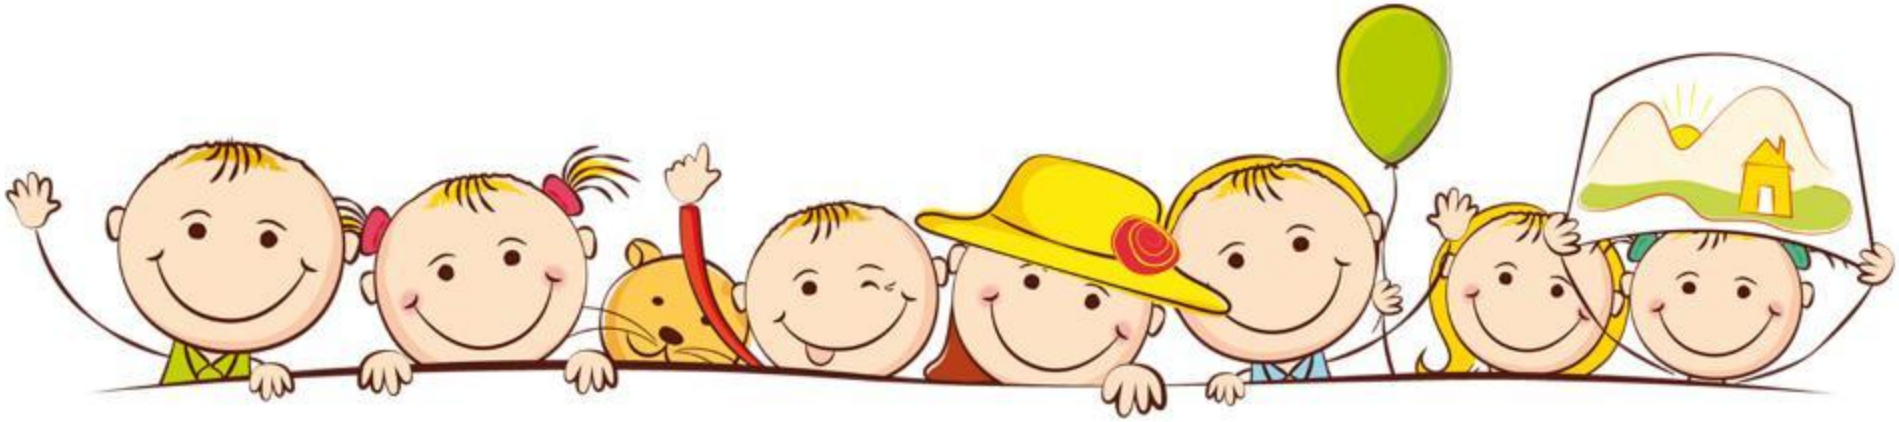

Цель проекта: создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения.

Задачи проекта:

- Организация социального партнерства «Школа – дошкольное учреждение – учреждение культуры -жители
- строительство волейбольной площадки
- проведение спортивных праздников и соревнований

http://aida.ucoz.ru

Механизм реализации проекта

Задача	Форма работы (мероприятие, акция и т.д.)	Сроки подготовки	Сроки проведения	Ответственный	Ресурсы	Результат
Организация социального партнерства «Школа – дошкольное учреждение-культура-жители	Собрание	03.2018	1.04.2018	Глазкова Н.А.	Человеческие (ДК.Микляиха)	1. Составление плана реализации проекта. 2. Разработка мероприятий по сбору средств.
Выбор места расположения площадки	Анкетирование, опрос жителей	02.2018	03.2018	Кашина Т.В. Руководители образовательных учреждений.	Человеческие (Печатная продукция.)	Место расположения площадки.
Разработка плана волейбольной спортивной площадки	Собрание	Февраль 2018	Март 2018.	Лаврентьев Е.А.	Интеллектуальны (Интернет ресурсы)	План площадки.

Механизм реализации проекта

Поиск спонсорской помощи	Акции по сбору средств с жителей поселка. Обращение к дирекции ОМФ. Обращение к депутатам.	04.2018	04.2018-06.2018	Кашина Т.В.	Человеческие, кадровые, управленческие.	Финансовые средства
Создание волейбольной спортивной площадки.	Собрания, сборы активистов и волонтеров.	Апрель 2018	Май-октябрь	Лаврентьев Е.А.	Материальные, человеческие, кадровые, управленческие.	Площадка
Торжественное открытие площадки	Праздничное спортивное мероприятие	Октябрь 2018	Октябрь 2018	Пушкина Р.Л.	Человеческие	Праздник
Аналитический и финансовый отчет по проекту	Собрание	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Глазкова Н.А. Кашина Т.В.	Интеллектуальные	Отчет

Ожидаемые результаты:

- развитие спортивной инфраструктуры поселка
- повышение мотивации и регулярным занятиям физической культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей поселка Микляиха;
- привлечение учащихся, молодежи и жителей к активному участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях;
- повышение интереса к спортивному досугу, снижение процента правонарушений
- увеличение количества детей, занимающихся спортом и физической культурой;
- увеличение количества детей, которые могут сами провести и организовать спортивный отдых;
- создание в поселке волонтерского отряда для строительства площадки

Ориентировочная стоимость проекта

Наименование	Цена	Количество	Стоимость	Источник финансирования
Планировка грейдером поля площадки		162 кв.м	10 000 руб.	Спонсорская помощь от ОМФ
Машина с песком	4 000	3 шт.	12000 руб.	Спонсорская помощь от ОМФ
Машина с землёй	6 000	3 шт.	18 000 руб.	Спонсорская помощь от ОМФ
Машина с битым кирпичём	4000	2 шт.	8000 руб.	Спонсорская помощь от ОМФ
Волейбольная сетка со стойками		1 компл.	9100руб	Пожертвования жителей поселка
Ограждение сеткой волейбольной площадки		162 кв м	15000 руб.	помощь от депутатов
Резиновое покрытие		162 кв. м	240 000 руб.	
Итого				312 000 руб

Результат проекта
